

Fázis 2/3 telepítések helyzete

Mohácsi János, Farkas István, Kovács
András, Jákó András, Szabó Szabolcs,
Ivánszky Gábor, Kovács Attila,
Mészáros Mihály, Dócs István + a
regközpontok


Budapesti helyszínek

- Invitel helyszínek kész vannak:
 - MOL, MTA Budavár, MTA KKKI, OSZK, PPKE JÁK, ZMNE
- Pantel helyszínek kész vannak:
 - MNM, SZIE ÁOK, SZIE YMFK
- Trafficom helyszínek kész vannak:
 - Sapientia, BGF KVIF
- GTS Datamet helyszínek még NEM készek:
 - MTA CSKI, BMF

Vidéki helyszínek

NIIF/HUNGARNET backbone


March 2006

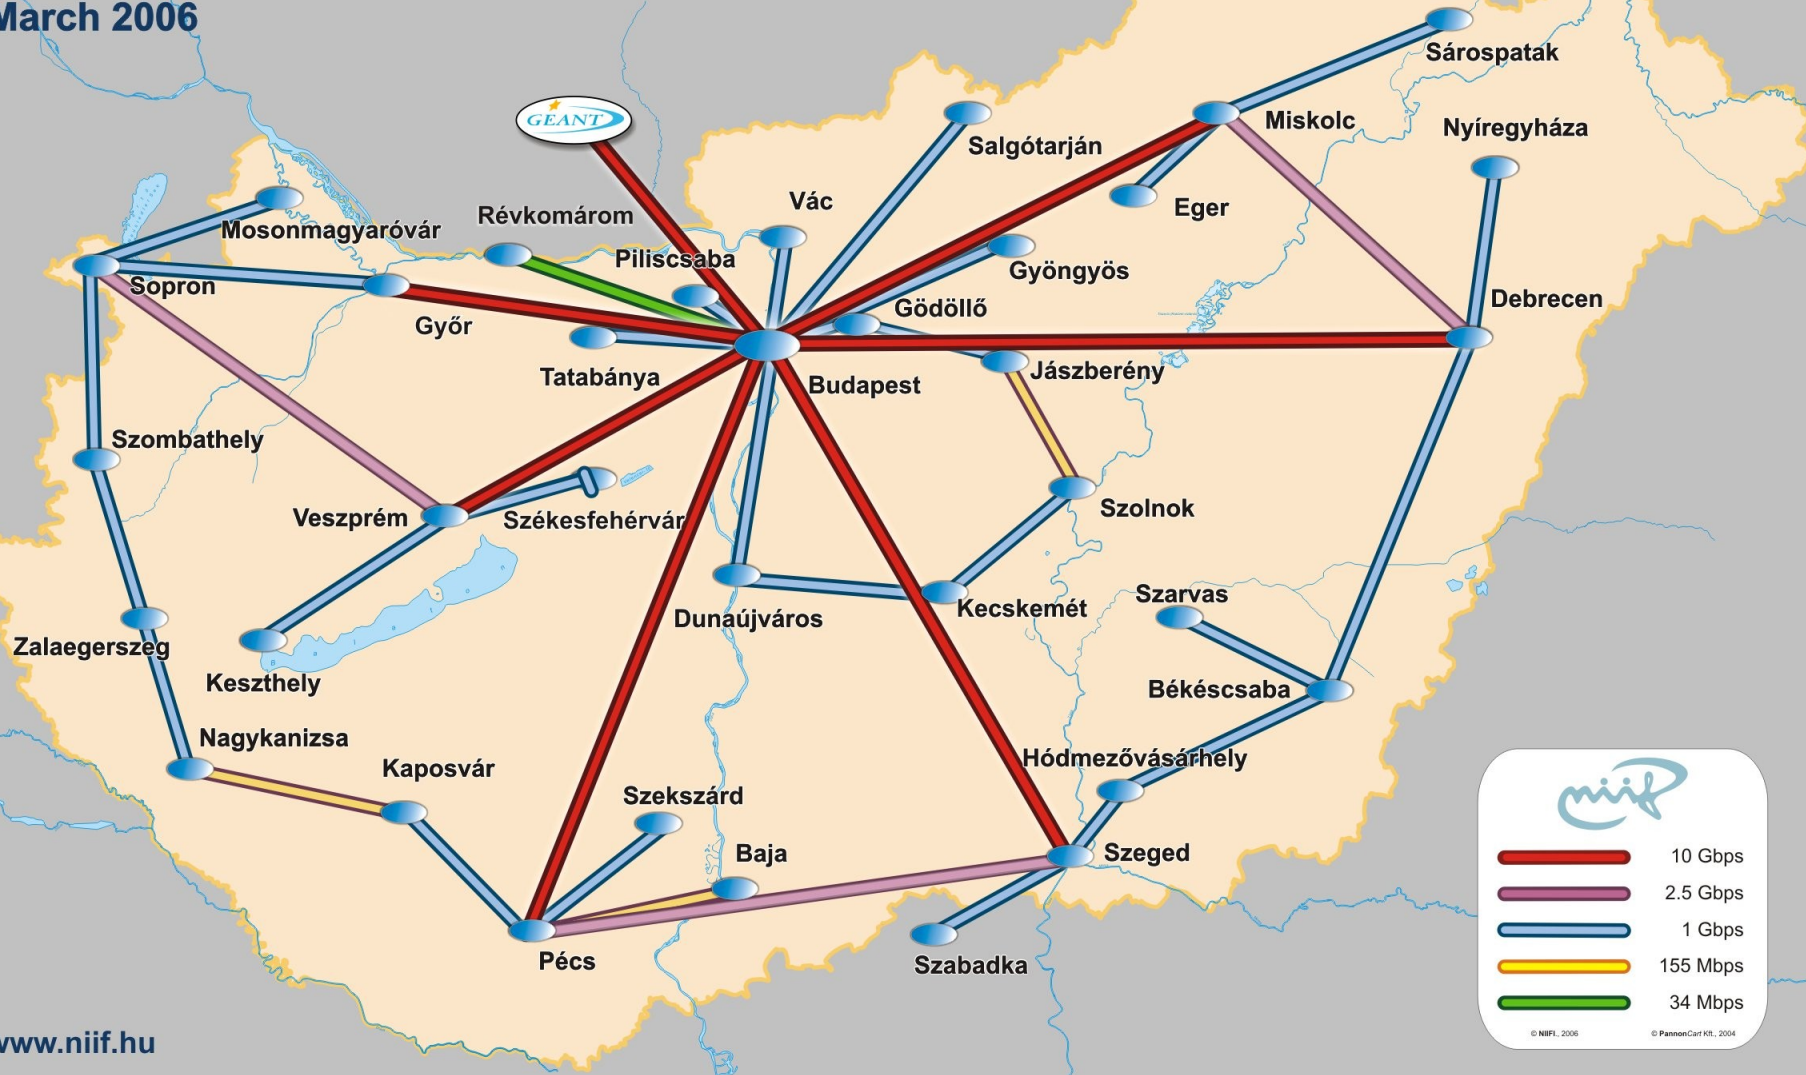


Vidék 1. menet

- Invitel ütemezésétől kicsit csúszva de átadta a kapcsolatokat:
 - Szeged –Hódmezővásárhely 1GE
 - NIIF- Dunújváros 1GE
 - Gödöllő – Jászberény 1GE
- Most teszteli:
 - Jászberény- Szolnok 155 Mpbs


Szeged-Hódmezővásárhely

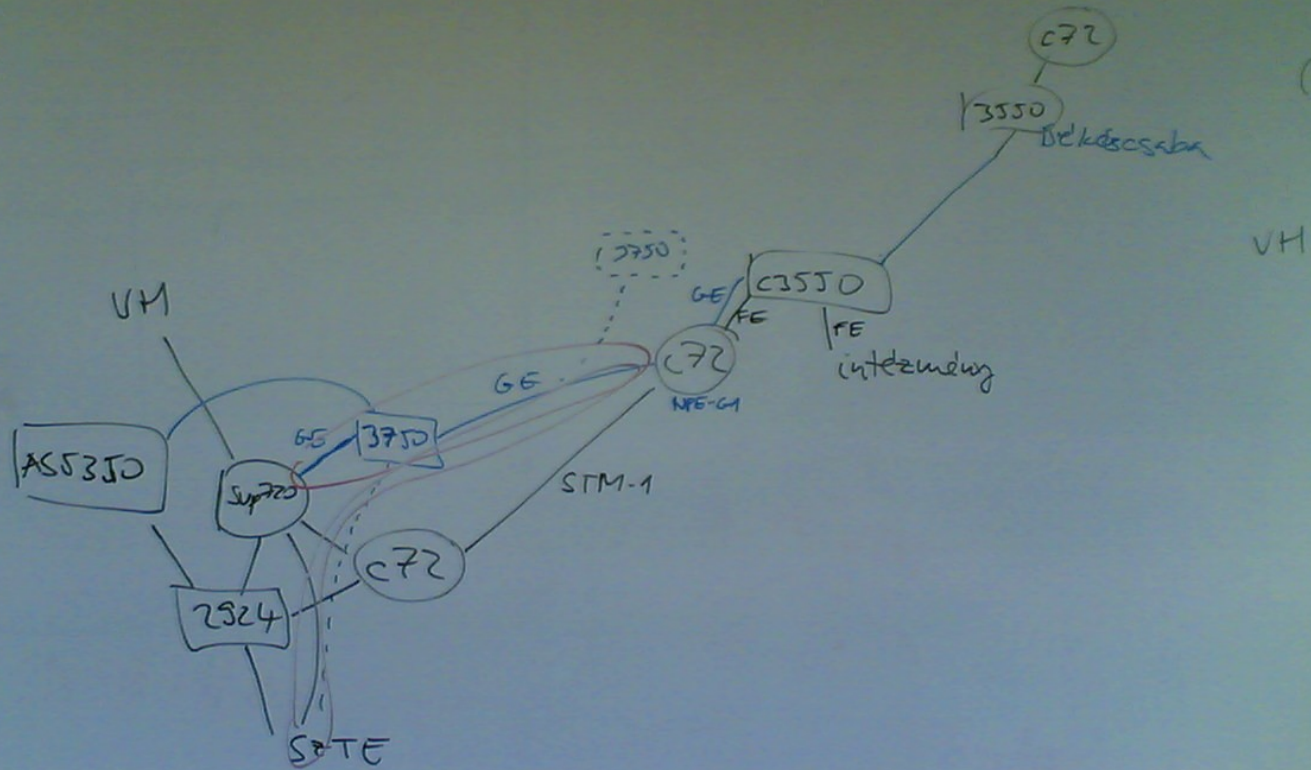

NIIF-Dunaújváros

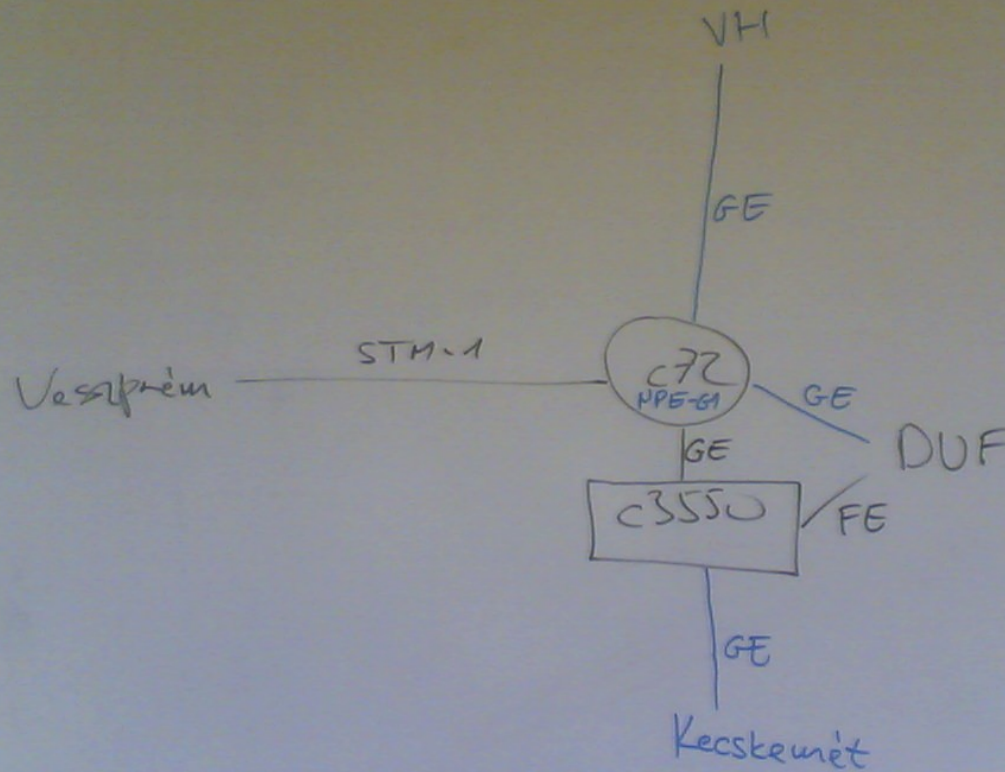


Gödöllő-Jászberény

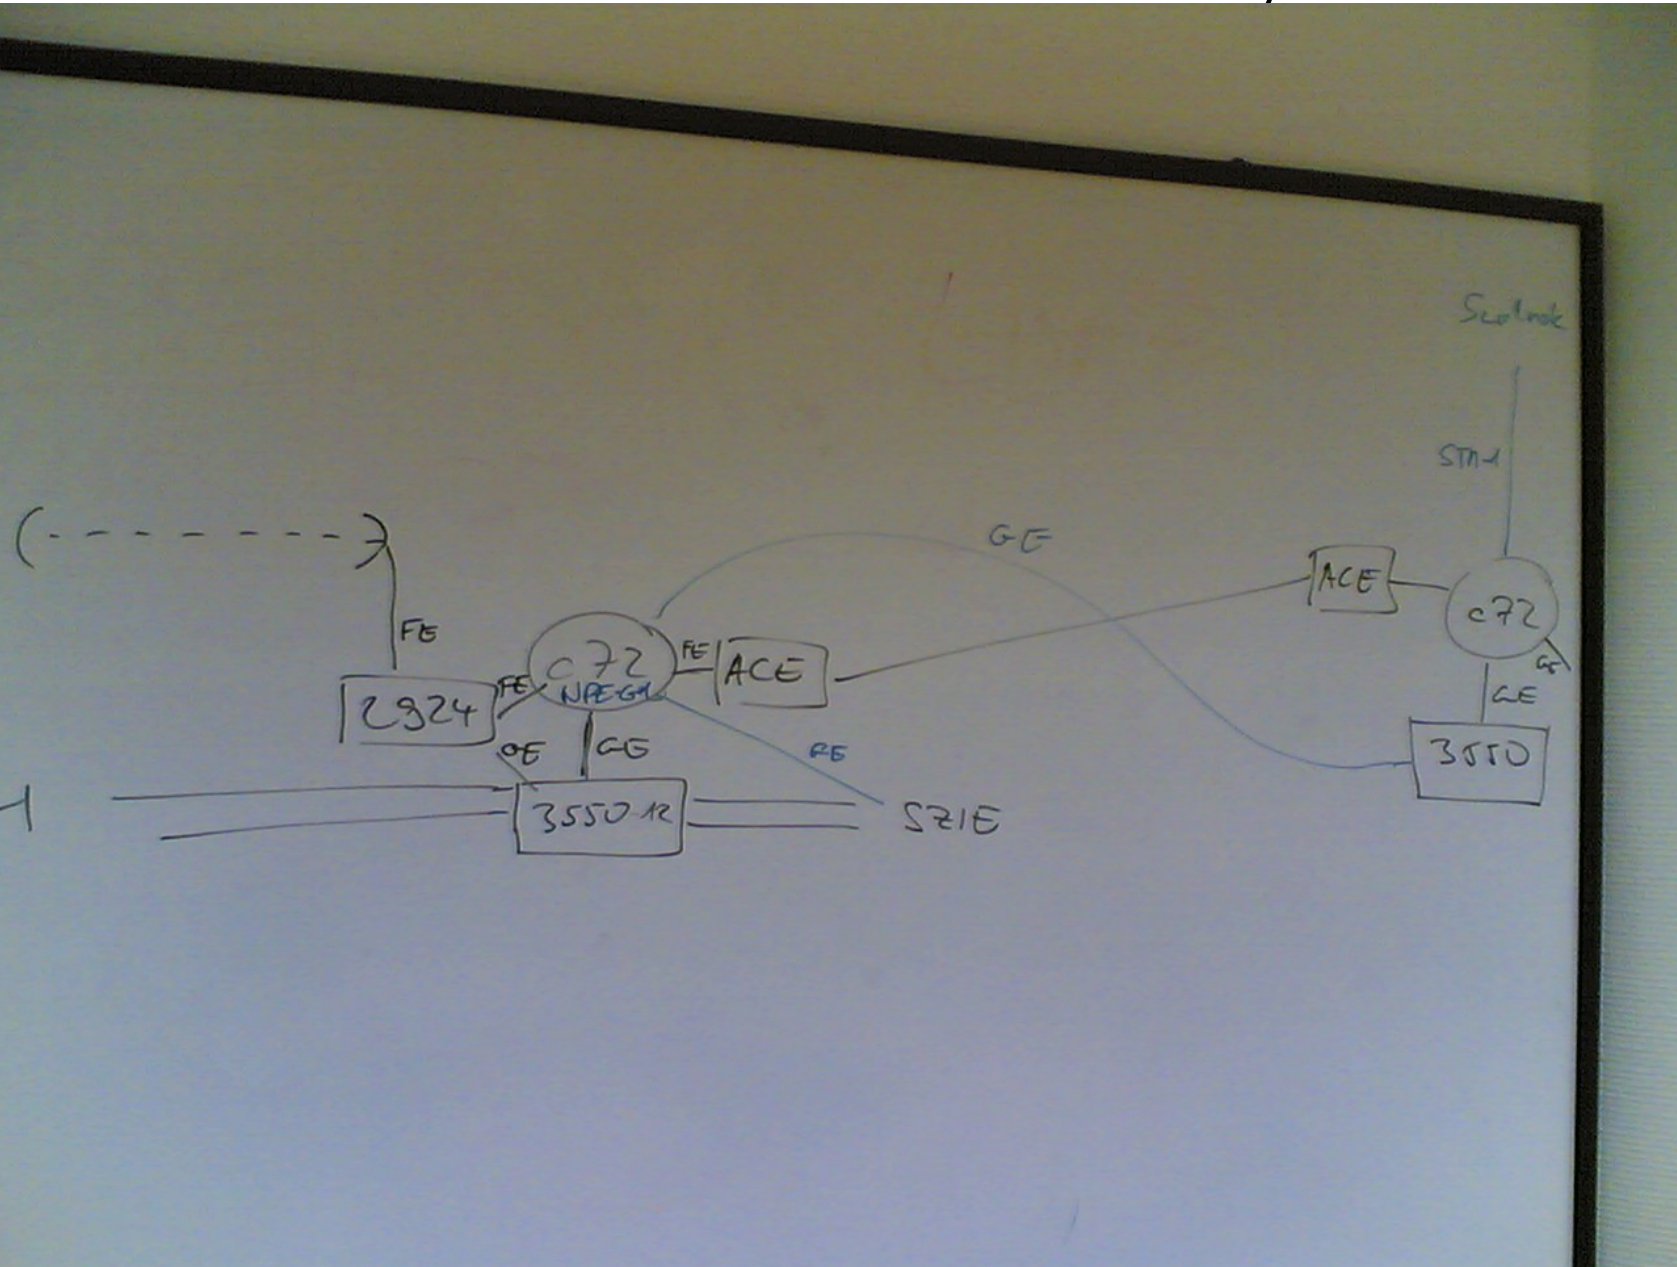


Vidék 2. menet -1

- Magyar Telekom átadott tesztelésre 10 kapcsolatot:
- Elkészült
 - Debrecen-Nyíregyháza 1GE
 - Győr-Mosonmagyaróvár 1GE – ma áll át használatba
- T-com probléma miatt rövidesen
 - Sopron-Szombathely 1GE
 - Szombathely-Zalaegerszeg 1GE
- Pénteken
 - NIIF-Tatabánya 1GE


Debrecen-Nyíregyháza

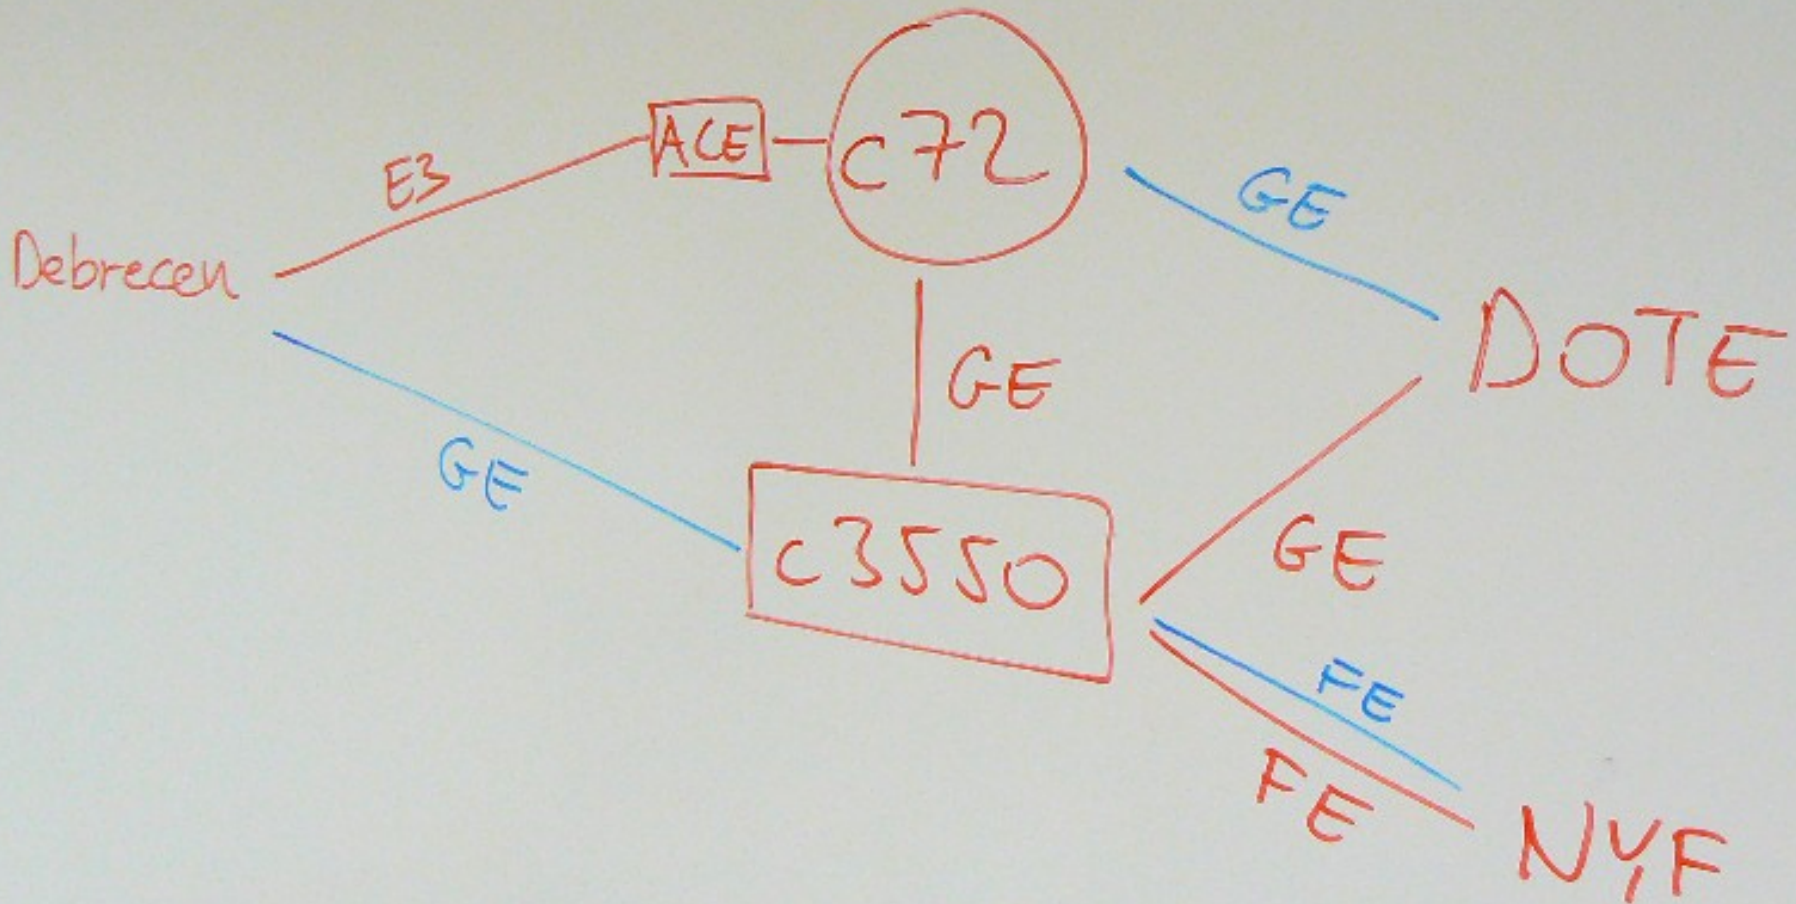


Győr-Mosonmagyaróvár

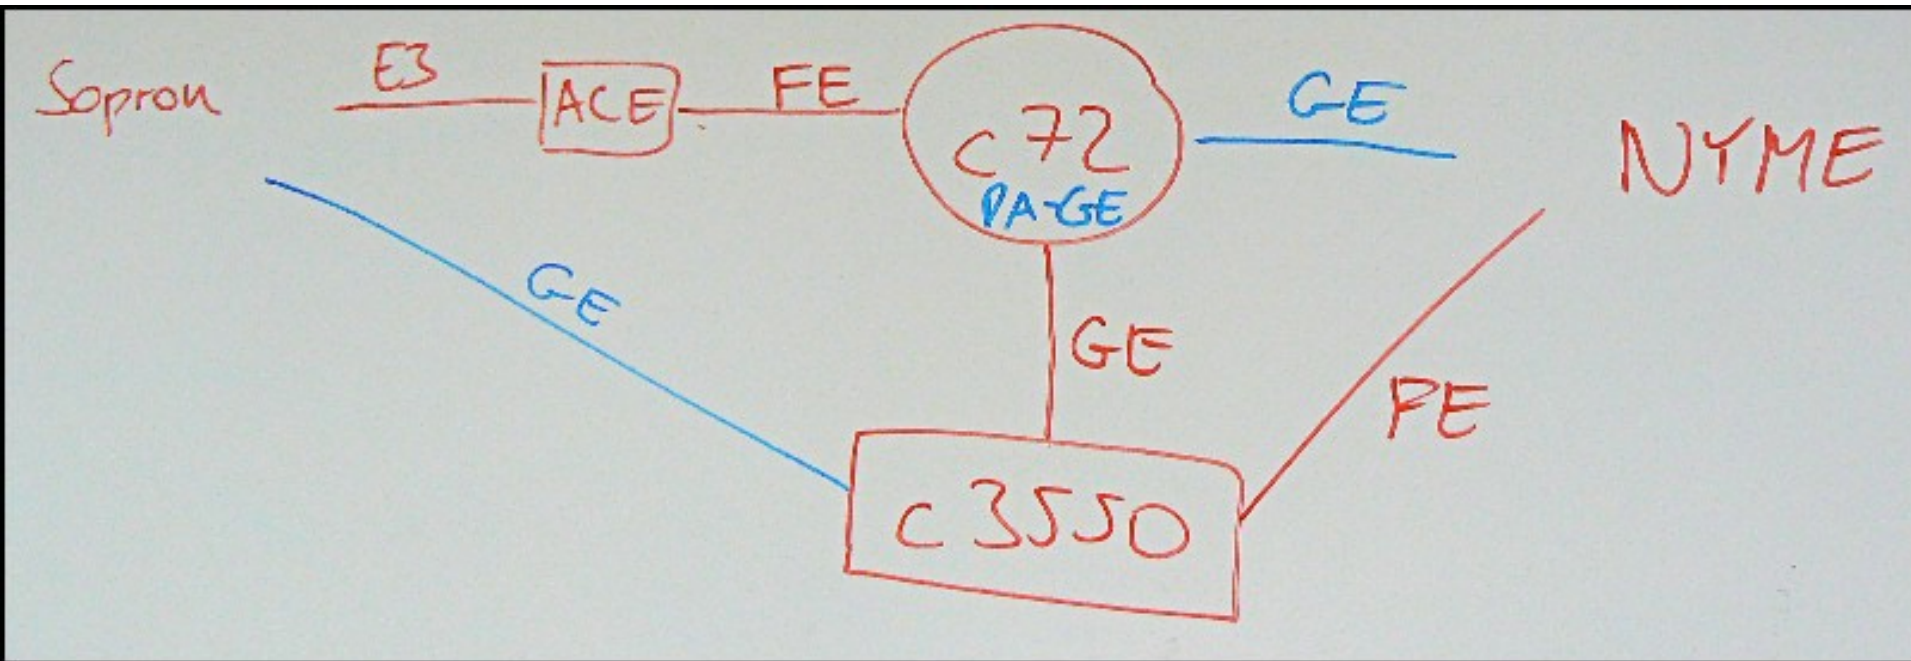


Sopron-Szombathely

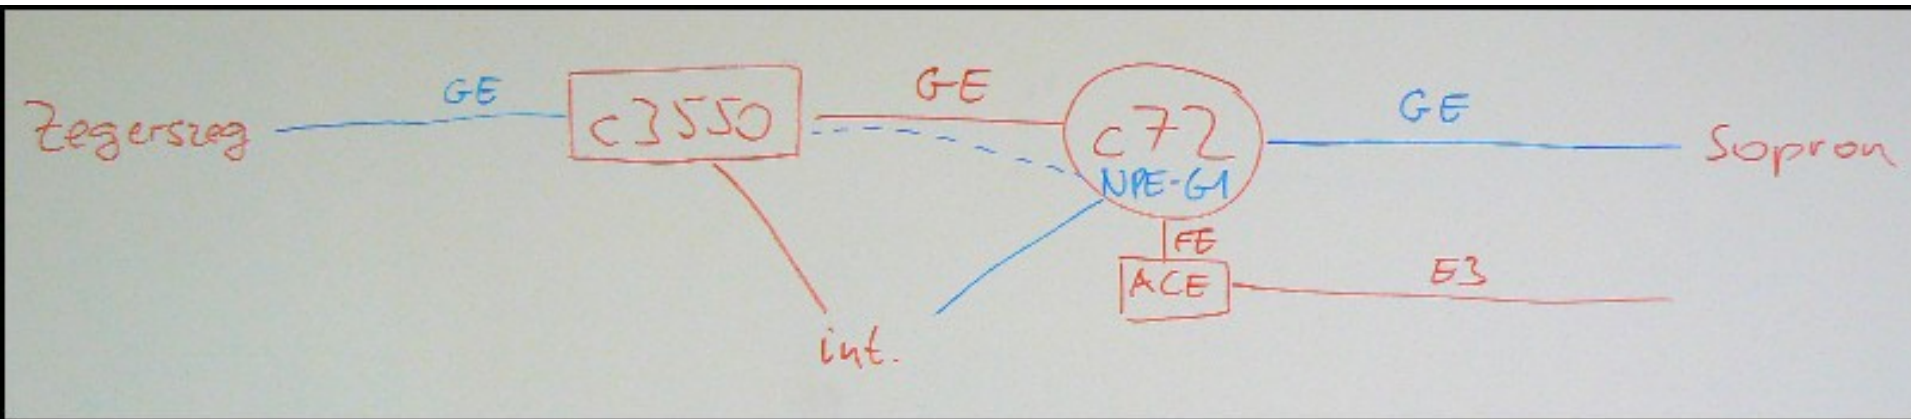

Sopron

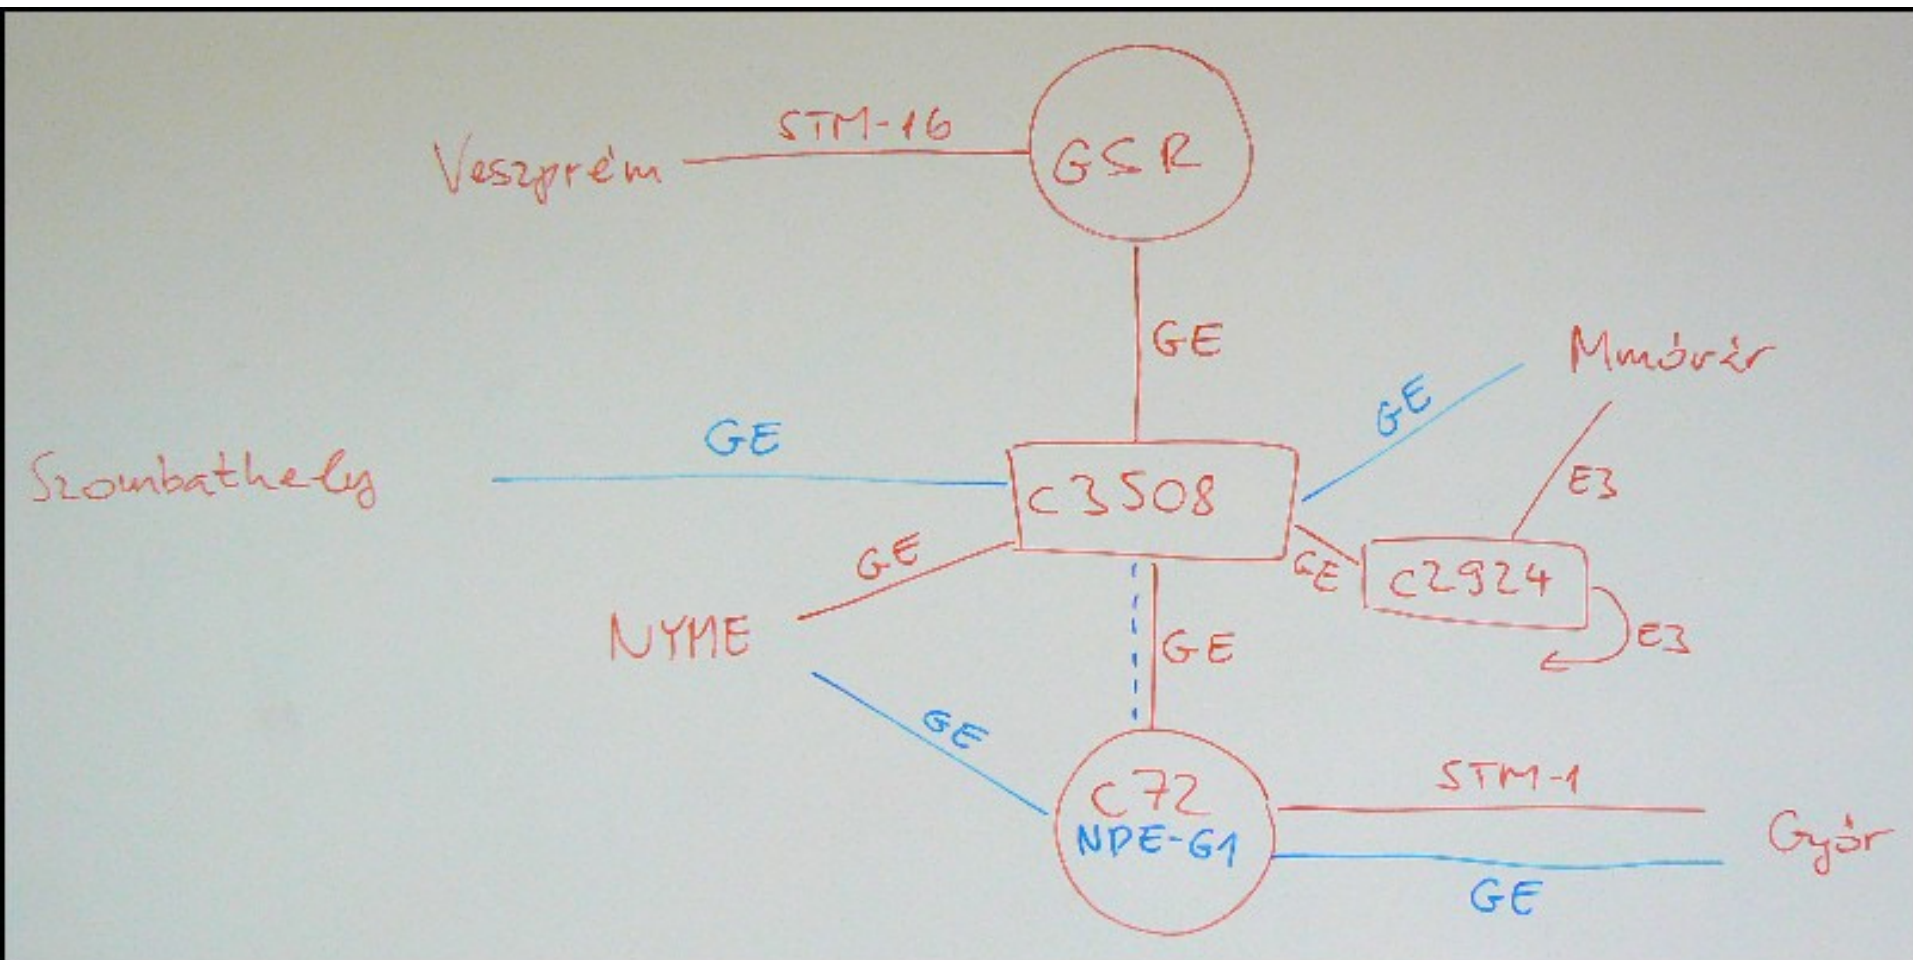


Szombathely-Zalaegerszeg

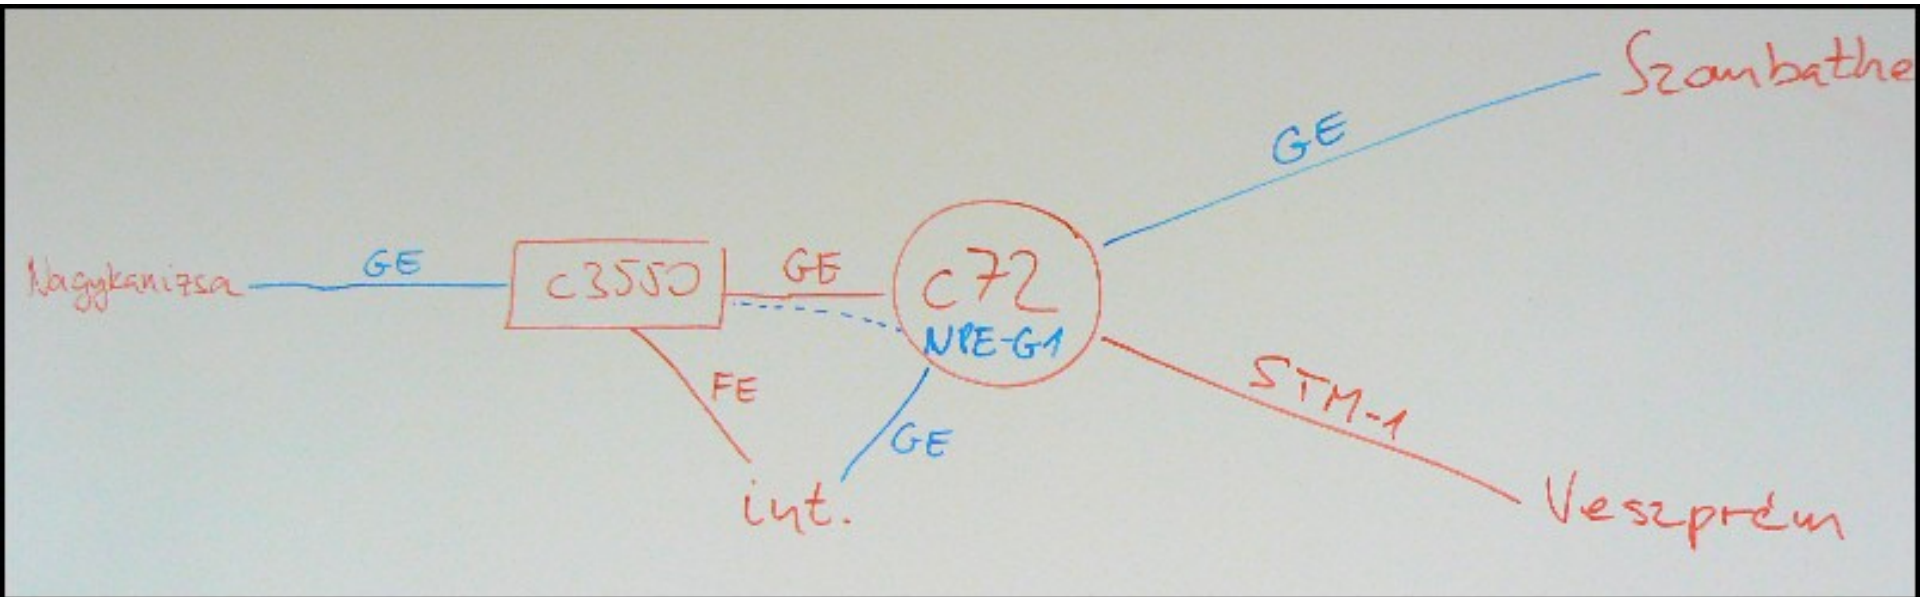


Vidék 2. menet – Jövő hét

- Magyar Telekom – maradék 4
 - Debrecen- Békéscsaba - 1GE
 - Pécs-Kaposvár - 1GE
 - Pécs-Szekszárd – 1GE
 - Miskolc-Sárospatak – 1GE
 - Miskolc-Eger – 1GE
- Invitel - maradék 1
 - Jászberény-Szolnok 155M


Debrecen-Békéscsaba

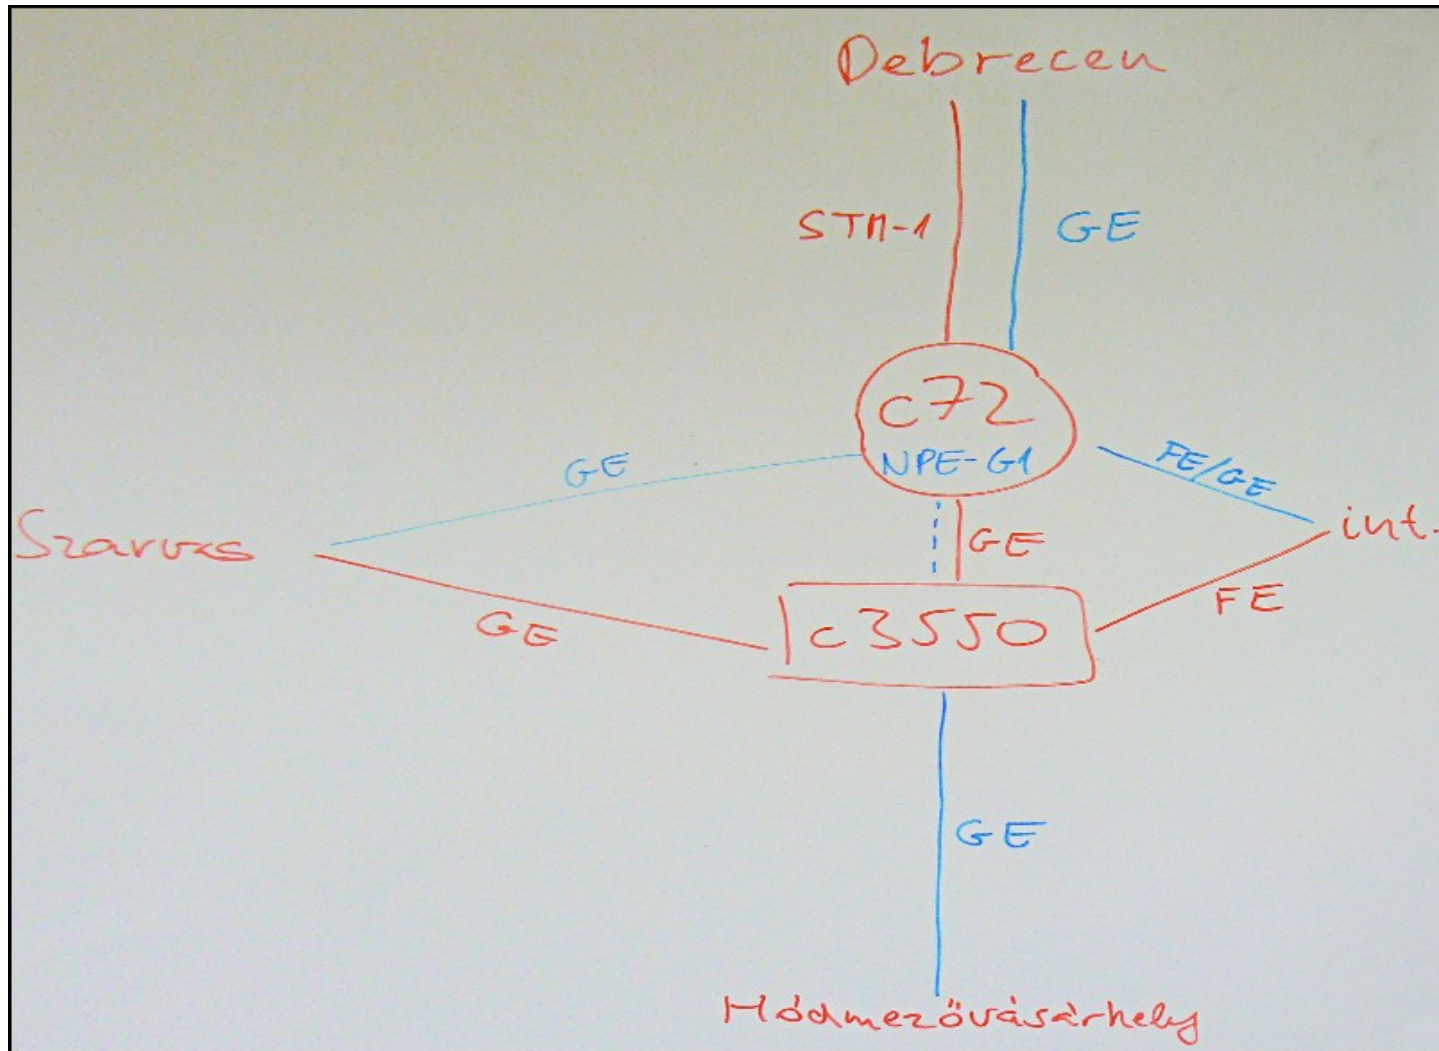

Pécs

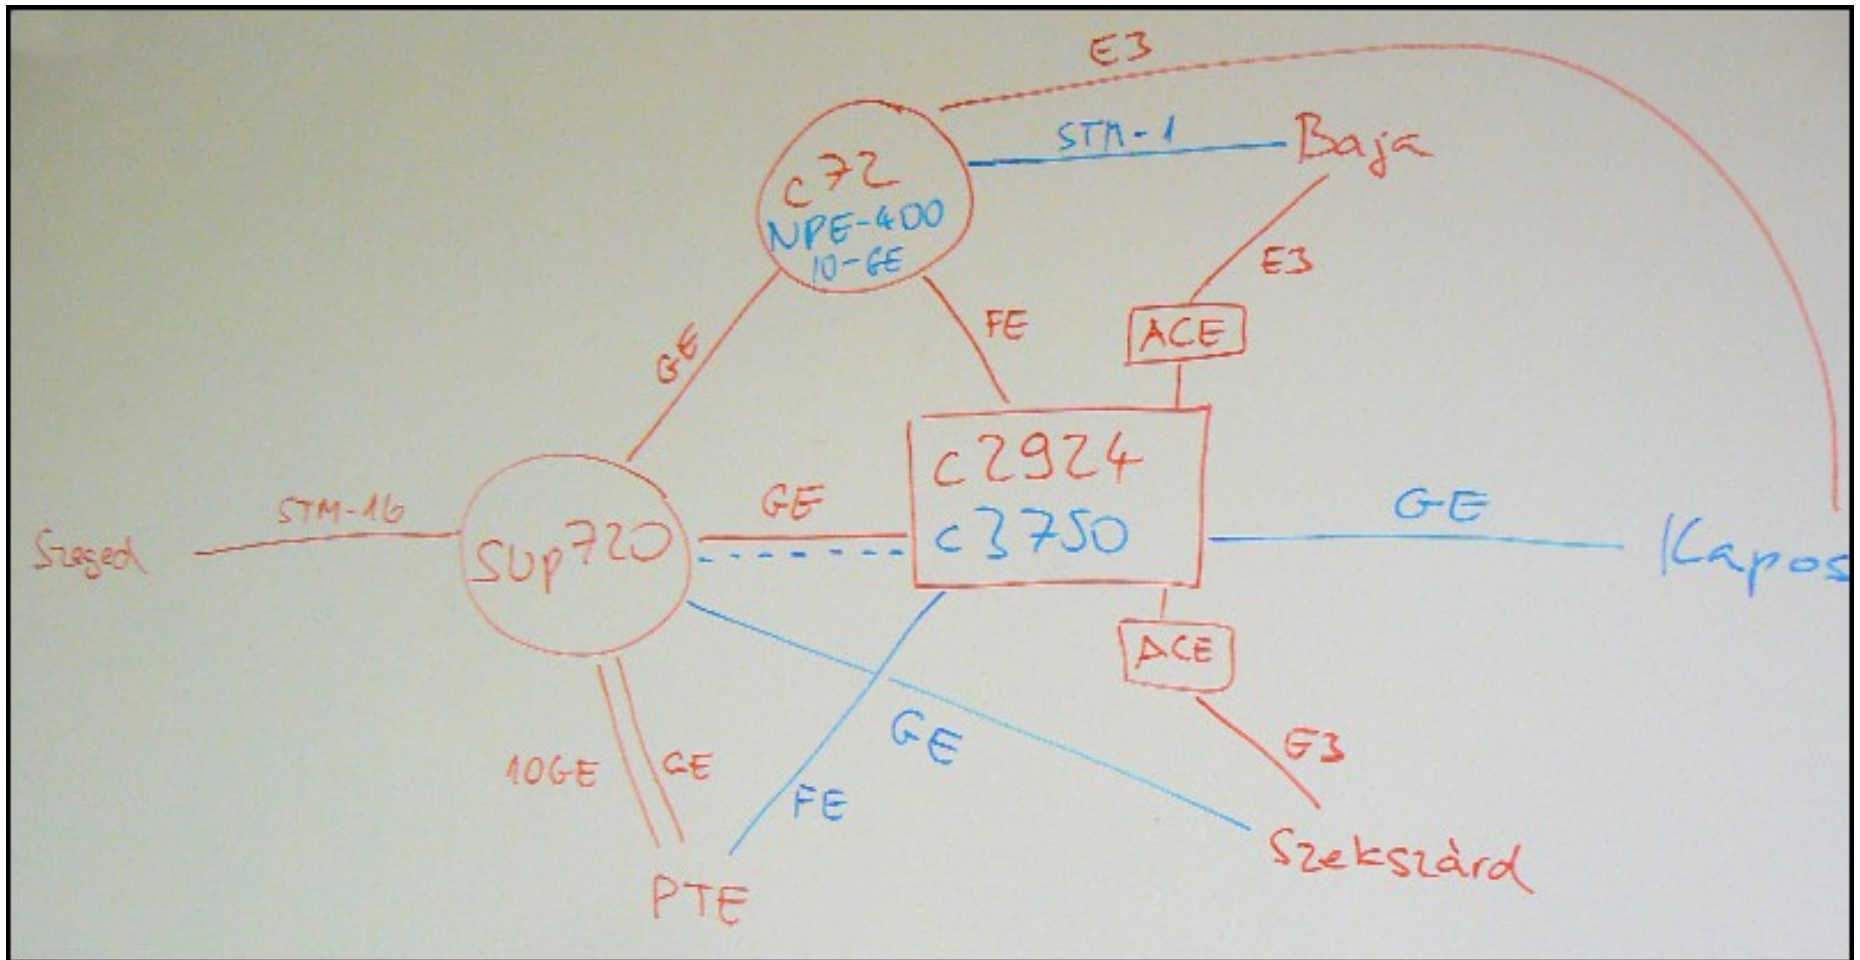

Pécs-Kaposvár

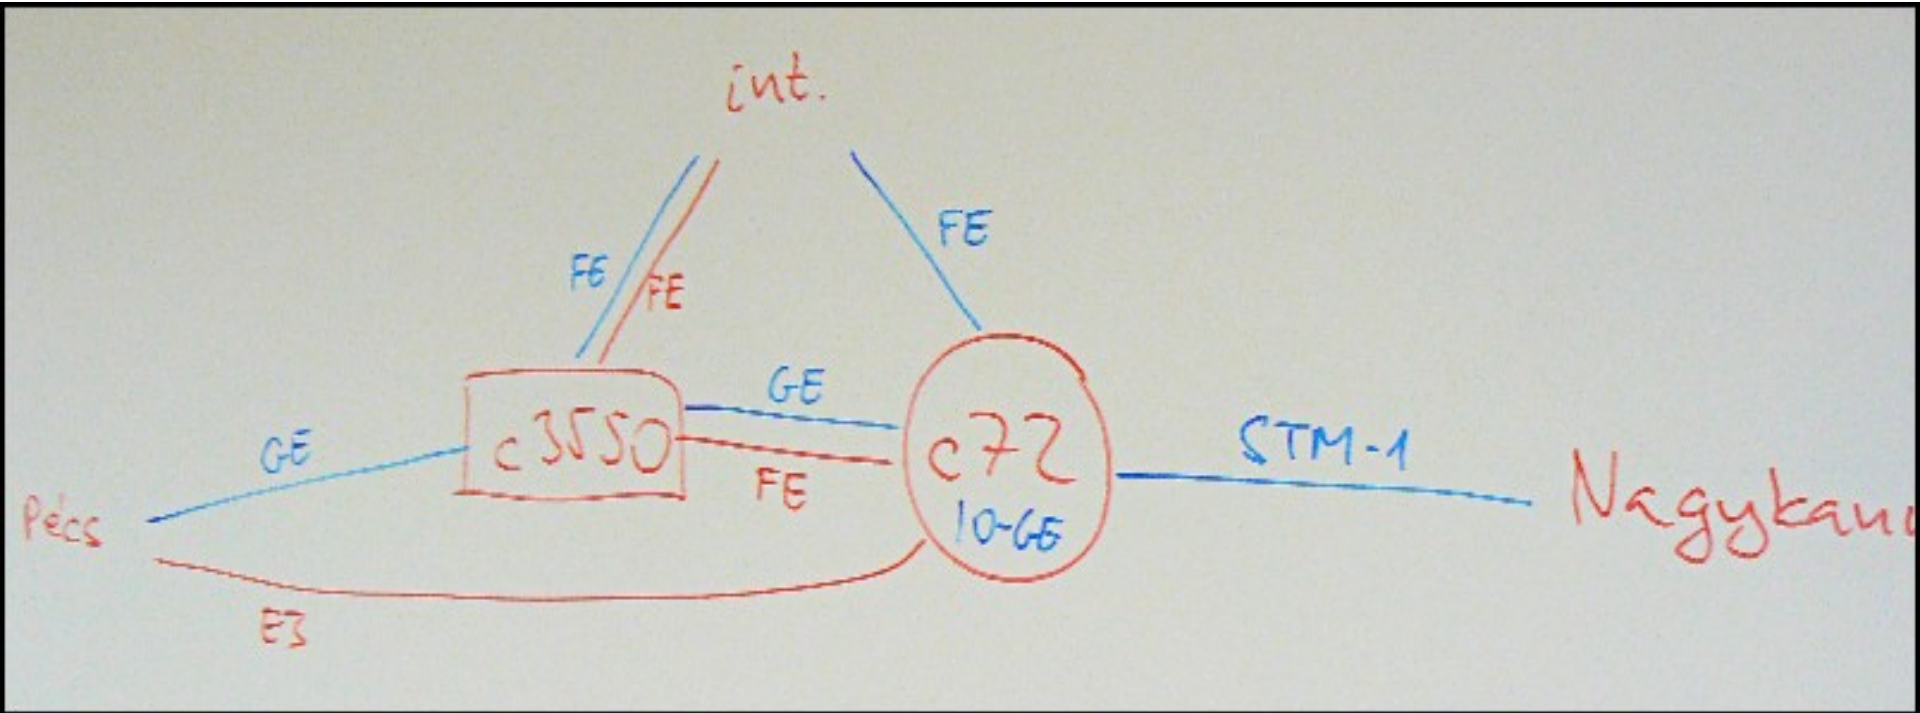

Ami hátra van

- 3 Pantel kapcsolat
- 8 Magyar Telekom kapcsolat
- 1 GTS-Datanet kapcsolat
